



**Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios**



AVANCE NUEVOS CUPOS

SAN ANGEL

RIOHACHA

PILAMO

FEBRERO DE 2025.



1) PILAMO. (1500 ppl)

La obra se encuentra en ejecución en dos etapas y esta asegurada su finalización :

Etapas 1: Enterritorio

Etapas 2: Contein.

Entrega programada Conpes 4082/2022 – entre 2022 y 2025.

Entrega final programada – Finales 2026.

NUEVO ERON PEREIRA PILAMO - FASE 1


Contrato de obra	2182503-2019 – FASE I
Fecha Inicio	18 de febrero de 2019
Contrato de Interventoría	2190239-2019
Fecha Inicio	18 de febrero de 2019
Fecha PREVISTA de terminación	6 de junio de 2024
Valor actual	\$132.249.952.350
% avance físico	90%

NUEVO ERON PEREIRA PILAMO - FASE 2

Contrato de obra	150-2024
Fecha Inicio	26 de abril de 2024
Contrato de Interventoría	358-2023
Fecha Inicio	17 de mayo de 2024
Fecha PREVISTA de terminación	Diciembre de 2026
Valor actual	\$118.524.270.968
% avance físico	8,6%



Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

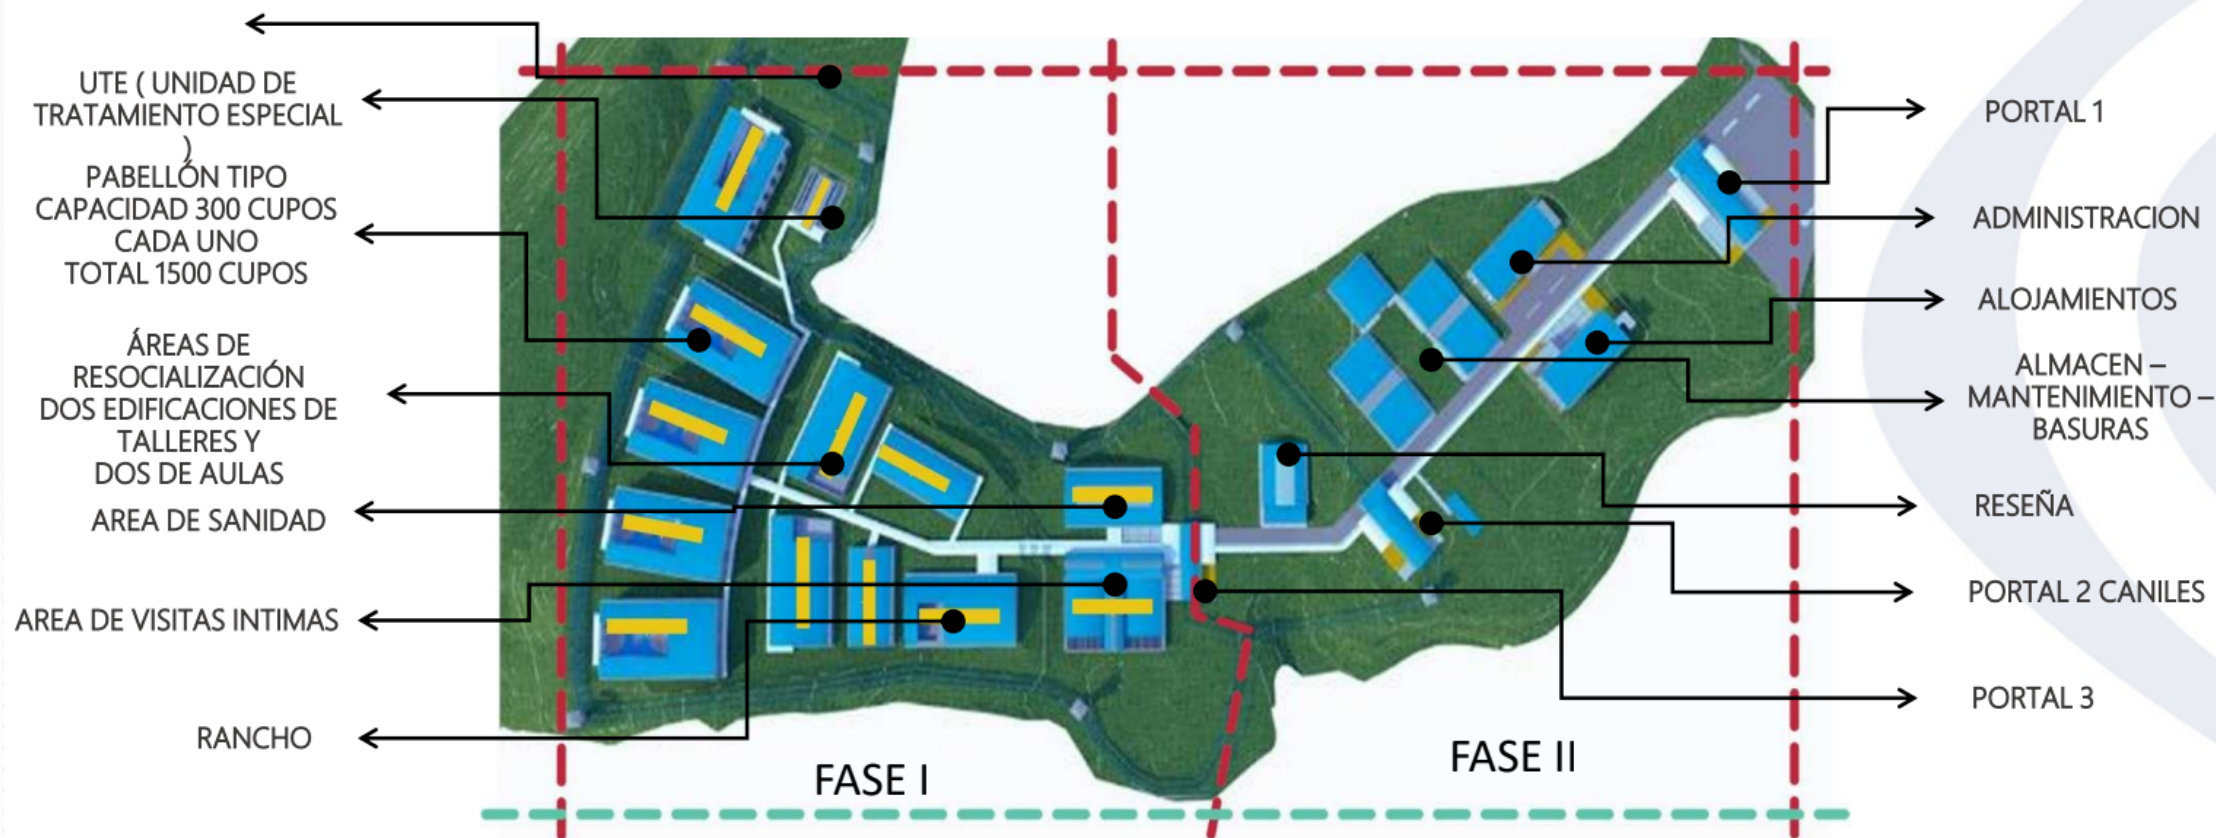



Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios



4/11/2024



4/11/2024

VARELA FIHOLL ARQUITECTURA & CONCRETO
EDICIÓN POR LUISA ROMERO

CONSORCIO PILAMO
CENTRO PENITENCIARIO LA CONCORDIA



4/11/2024



ERON PILAMO.

- Componentes generales:

- . UN EDIFICIO DE SANIDAD
- . UN EDIFICIO DE VISITAS
- . UN EDIFICIO DE RANCHO
- . DOS EDIFICIOS DE AULAS
- . DOS EDIFICIOS DE TALLERES
- . CINCO PABELLONES SOLO HOMBRES
- . UN EDIFICIO UTE
- . UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTO DE GUARDIA
- . PORTAL DE INGRESO, RESEÑA, CANILES.



2) San Angel. (1974 ppl)

La obra se encuentra en ejecución y esta asegurada su finalización :

Entrega programada Conpes 4082/2022 – entre 2022 y 2026.

Entrega final programada – Diciembre 2025.

Entrega probable con dotación – primer trimestre 2026.

NUEVO ERON SABANAS DE SAN ANGEL	
Contrato de obra	304-2019
Fecha Inicio	14 de febrero de 2020
Contrato de Interventoría	325-2019
Fecha Inicio	14 de febrero de 2020
Fecha PREVISTA de terminación	Diciembre de 2025
Valor actual	\$275.401.001.315
% avance físico	51%





Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios





ERON SAN ANGEL.

- Componentes:

- . SIETE PABELLONES DE HOMBRES Y SEIS CON AULAS.
- . DOS EDIFICIOS DE VISITAS
- . UN EDIFICIO DE UTE HOMBRES
- . EDIFICIO DE ADMINISTRACION, DOS ALOJAMIENTOS DE GUARDIAS, CANILES.
- . GUARDIA INTERNA, GUARDIA EXTERNA, SANIDAD
- . RANCHO Y ALOJAMIENTO DE RANCHEROS
- . DOS EDIFICIOS DE TALLERES
- . PTAR Y PTAP



6) NUEVO ERON RIOACHA (1722 ppl)

6.1) Establecimiento completo en un área de 36,000 m². La construcción del ERON incluye diversas edificaciones y áreas funcionales como pabellones + pabellon mujeres + pabellon poblacion wuayu + aulas + talleres + rancho + sanidad + etc.

Se estima entrega para Diciembre del año 2025.

NUEVO ERON RIOHACHA -GUAJIRA	
Contrato de obra	276-2020
Fecha Inicio	22 de junio de 2021
Contrato de Interventoría	186-2021
Fecha Inicio	22 de junio de 2021
Fecha PREVISTA de terminación	Diciembre de 2025
Valor actual	\$251.032.681.822
% avance físico	61%



Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios





ERON RIOHACHA.

- Componentes Generales:

SEIS PABELLONES PARA HOMBRES

UN PABELLON HOMBRES PARA LA COMUNIDAD WUAYU

UN PABELLON PARA MUJERES

UN CDI PARA LOS NIÑOS DE LAS INTERNAS

UNA EDIFICACION PARA MATERNAS

UN EDIFICIO UTE

PTAR

UNA EDIFICACION EDUCATIVAS

UNA EDIFICACION DE TALLERES

UN EDIFICACION DE SANIDAD

RANCHO

VISITAS
